




# Tableaux de bord Evaluation des performances des projets (marketing et IT)


## ACTUALISATION DU DASHBOARD

### Etapes de mise à jour des données :

1 - Dans l'onglet Accueil, cliquer sur la flèche en bas du bouton Transformer les données




2 - Cliquer sur paramètres de la source de données



3 - Cliquer sur le bouton changer la source...

4 - Parcourir pour choisir la nouvelle source



5 - Fermer la fenêtre

6 - Dans l'onglet Accueil, cliquer sur le bouton Actualiser

## Product strategy canevas

Utilisateur	Stories		
Directeur général	Il veut être alerté dès que l'écart entre le coût réel et prévu de la phase en cours de chaque projet atteint ou dépasse 15%, afin de pouvoir décider de la poursuite ou de l'arrêt des projets.	Il veut être alerté dès que l'écart entre les durées réelles et prévues de la phase en cours de chaque projet atteint ou dépasse 15%, afin de pouvoir décider de la poursuite ou de l'arrêt des projets.	Il veut être alerté dès que l'écart entre livrables réalisés et prévus de la phase en cours de chaque projet est en retard de 15%, afin de pouvoir décider de la poursuite ou de l'arrêt des projets.
Directeurs régionaux	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre le coût réel et prévu de la phase en cours de chaque projet de leur région atteint ou dépasse 15%, afin de suivre ces projets.	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre la durée réelle et prévue de la phase en cours de chaque projet de leur région atteint ou dépasse 15%, afin de suivre ces projets.	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre livrables réalisés et prévus de la phase en cours de chaque projet de leur région est en retard de 15%, afin de suivre ces projets.
Directeurs de pays	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre le coût réel et prévu de la phase en cours de chaque projet de leur pays atteint ou dépasse 15%, pour prendre d'éventuelles mesures correctives.	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre les durées réelles et prévues de la phase en cours de chaque projet de leur pays atteint ou dépasse 15%, pour prendre d'éventuelles mesures correctives.	Ils veulent être alertés dès que l'écart entre livrables réalisés et prévus de la phase en cours de chaque projet de leur pays sont en retard de 15%, pour prendre d'éventuelles mesures correctives.

## Modèle de données

- Modèle relationnel construit en majorité en étoile pour garantir la performance de l'outil.
- Table project\_plans permet de mettre en relation la majorité des autres tables.
- Nouvelle table de donnée créée (project\_state) pour calculer les différentes KPI.
- Des tables contiennent les phases des projets et d'autres des informations seulement à l'échelle des projets.

## Navigation

Vue globale

Régions

Pays

Projets

Type

Historique



SANITORAL



## Vue globale

4

projet(s) en cours

Choix de la région

Asia Pacific

Type de projet

IT



4

projet(s) en alerte

### Santé des projets



Alertes • 1 • 2



### Dépassement de coût

1

### Dépassement de durée

2

### Retard de livrables

2


### Coûts actuels et prévisionnels



### Durées actuelles et prévues (en j)



### Livrables réalisés et prévus



Questions / réponses

Régions

Pays

Projets

Type de projet

Central/Eastern  
Europe-Middle East-Africa

Western Europe



North and Latin America

Type de projet

Tout



Pays

Type de projet

Date de début des projets

01/01/2018

05/12/2018



Afficher détail du pays

11

projet(s) en cours


8

projet(s) en alerte

Coût actuels et prévisionnels



## Western Europe

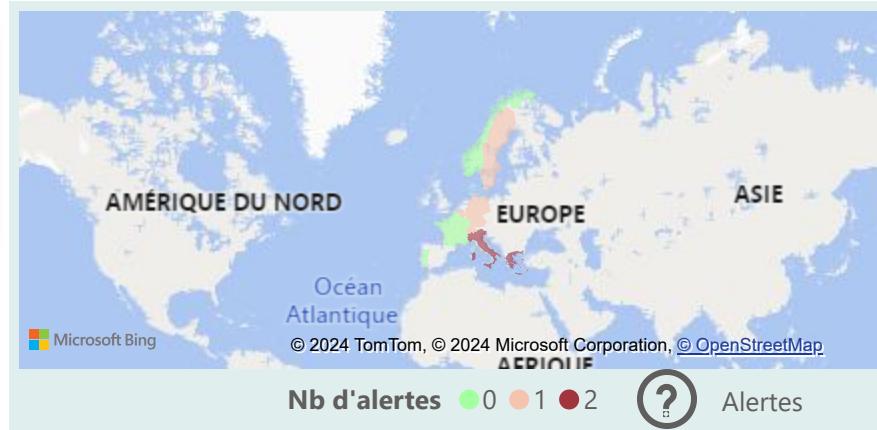

Country	Nb projets	Coût prévi.	Coût réel	Ecart Coût	Temps prévi.	Temps réel	Ecart Temps	Livrable prévi.	Livrables réels	Ecart Livrables
Allemagne	1	600K €	640K €	▲ 7 %	234	140	-40 %	43	39	▲ -9 %
Belgique	1	300K €	354K €	◆ 18 %	204	173	-15 %	17	15	▲ -12 %
France	2	1 800K €	1 613K €	● -10 %	771	645	-16 %	123	109	▲ -11 %
Grece	1	300K €	289K €	● -4 %	354	275	-22 %	63	55	▲ -13 %
Hollande	1	1 500K €	1 487K €	● -1 %	445	440	-1 %	98	92	▲ -6 %
Italie	1	600K €	694K €	◆ 16 %	168	255	52 %	34	33	▲ -3 %
Norvege	1	600K €	683K €	▲ 14 %	196	140	-29 %	41	39	▲ -5 %
Portugal	1	150K €	158K €	▲ 6 %	120	101	-16 %	11	11	● 0 %
Suede	1	600K €	708K €	◆ 18 %	208	170	-20 %	25	22	▲ -12 %
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>7 050K €</b>	<b>7 375K €</b>	<b>5 %</b>	<b>3024</b>	<b>2547</b>	<b>-16 %</b>	<b>490</b>	<b>449</b>	<b>-8 %</b>



Pays

Danemark

Types de projet

IT

Date de début des projets

01/01/2018 06/02/2022

Afficher détail du projet

Projets

Type de projet



Coûts actuels et prévisionnels



2

projet(s) en cours

2

projet(s) en alerte


Santé des projets

Alertes  
2


Alertes



Durées actuelles et prévues (en j)




Livrables actuels et prévisionnels



Project_ID	ProjectType	Coût prévu.	Coût réel	Ecart Coût	Temps prévu.	Temps réel	Ecart Temps	Livrable prévu.	Livrables réels	Ecart Livrables
80	IT	117K €	99K €	● -15 %	945	696	● -26 %	82	48	◆ -41 %
93	IT	74K €	85K €	▲ 14 %	565	536	● -5 %	97	92	▲ -5 %
Total		191K €	184K €	-4 %	1510	1232	-18 %	179	140	-22 %



**Projet ID**


✓


IT






Project_ID	Phase	Coût prévu.	Coût réel	Ecart Coût	Temps prévu.	Temps réel	Ecart Temps	Livrable prévu.	Livrables réels	Ecart Livrables
101	Phase A - Initiation	1K €	1K €	0 %	121	69	-43 %	25	21	-16 %
101	Phase B - Preparation	16K €	18K €	▲ 10 %	109	71	-35 %	30	29	-3 %
101	Phase C - Development	21K €	21K €	0 %	175	175	0 %	20	18	-10 %
101	Phase D - Testing	6K €	20K €	◆ 255 %	68	86	26 %	6	5	-17 %
101	Phase E - Deployment	75K €	39K €	◆ -48 %	2	6	200 %	5	5	0 %
101	Phase F - Post-deployment	3K €	3K €	▲ 4 %	64	89	39 %	10	9	-10 %
<b>Total</b>		<b>121K €</b>	<b>101K €</b>	<b>-17 %</b>	<b>539</b>	<b>496</b>	<b>-8 %</b>	<b>96</b>	<b>87</b>	<b>-9 %</b>

Projets et phases respectives selon date de début théorique et date de fin théorique

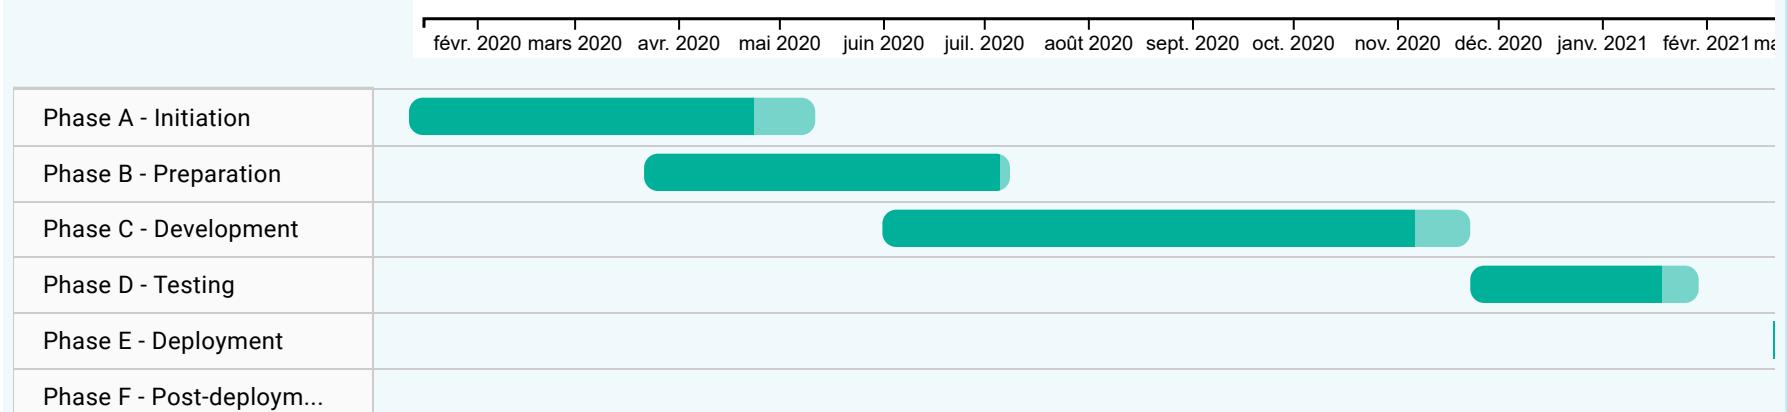



# Analyses détaillées par type de projets (projets en cours)

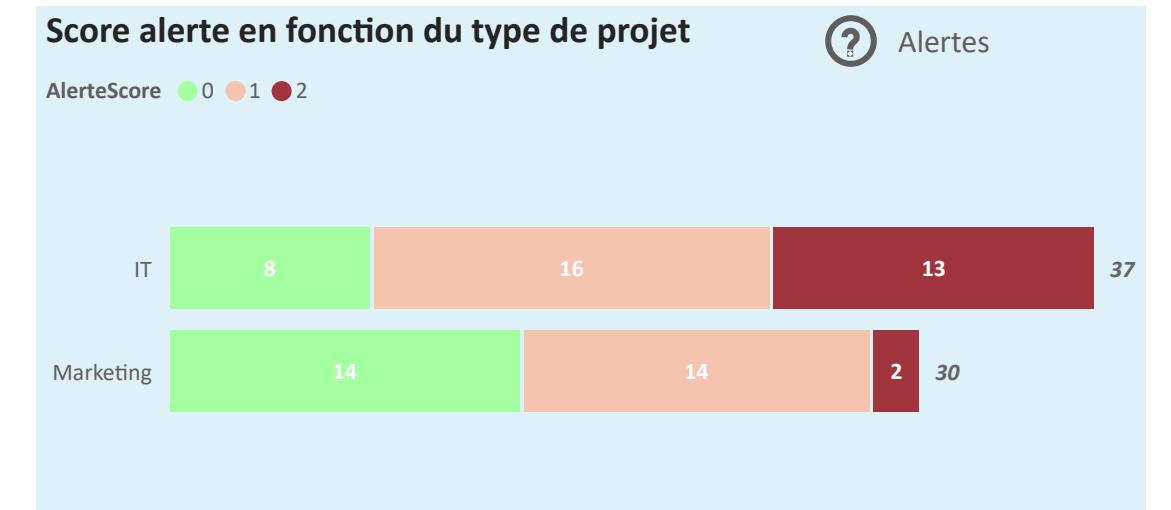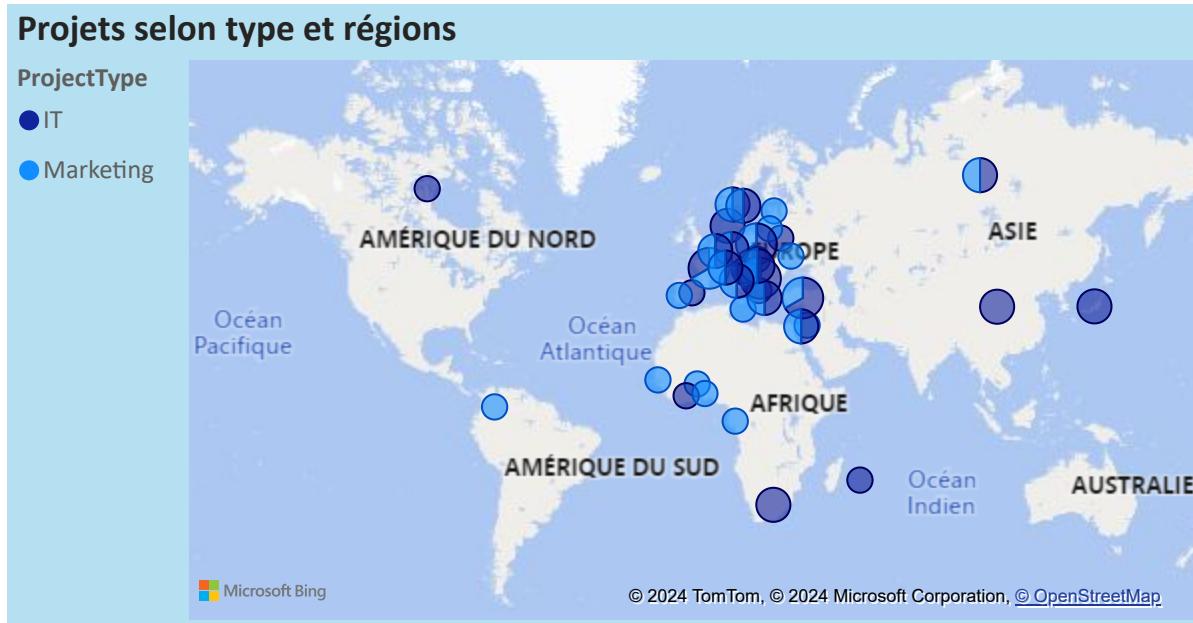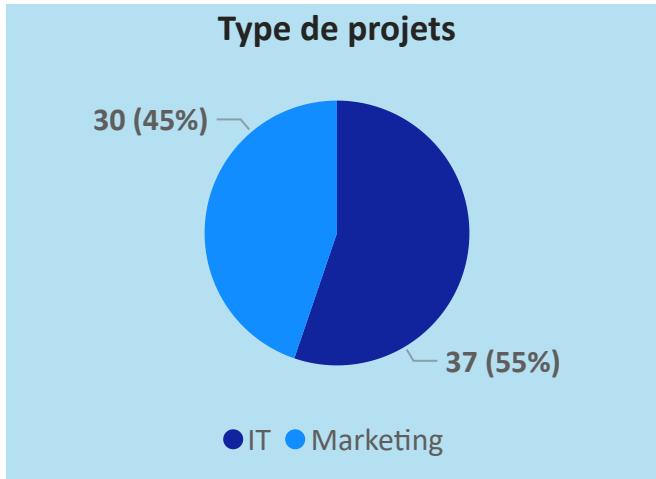




# Historique des projets terminés

6

projets terminés

Type de projets



Choix de la région

Asia Pacific



Projets Marketing

Coût des projets

(Vide)

0M €

0M €

Durée des projets

(Vide)

0

1

Livrables des projets

(Vide)

0

1

Projets IT

Coût des projets

0,5M€

0M €

/ 1M €

Durée des projets

2940

0

5880

3654

Livrables des projets

632

0

1264



## Projets en cours et en alerte

ID projet	Pays	Type	Alertes	Coût prévu.	Coût réel	Ecart Coût	Temps prévu.	Temps réel	Ecart Temps	Livrable prévu.	Livrables réels	Ecart Livrables
63	Allemagne	IT	2	78K €	125K €	◆ 59 %	582	571	● -2 %	83	77	▲ -7 %
65	Croatie	IT	1	48K €	75K €	◆ 56 %	442	478	▲ 8 %	105	98	▲ -7 %
46	Macedoine	Marketing	1	750K €	1 037K €	◆ 38 %	454	225	● -50 %	74	71	▲ -4 %
57	Japon	IT	1	78K €	108K €	◆ 38 %	691	596	● -14 %	73	68	▲ -7 %
42	Lituanie	Marketing	1	750K €	1 019K €	◆ 36 %	576	260	● -55 %	73	67	▲ -8 %
32	Turquie	Marketing	1	750K €	1 009K €	◆ 34 %	351	210	● -40 %	49	45	▲ -8 %
23	Suisse	Marketing	1	1 500K €	1 936K €	◆ 29 %	248	213	● -14 %	56	52	▲ -7 %
50	Serbie	Marketing	1	750K €	967K €	◆ 29 %	544	276	● -49 %	66	62	▲ -6 %
37	Pologne	Marketing	1	750K €	960K €	◆ 28 %	385	257	● -33 %	58	55	▲ -5 %
45	Gambie	Marketing	1	500K €	639K €	◆ 28 %	537	359	● -33 %	79	72	▲ -9 %
20	Colombie	Marketing	1	750K €	938K €	◆ 25 %	416	429	▲ 3 %	85	79	▲ -7 %
66	Slovenie	IT	1	90K €	112K €	◆ 24 %	718	511	● -29 %	135	120	▲ -11 %
29	Belgique	Marketing	1	750K €	921K €	◆ 23 %	209	176	● -16 %	33	30	▲ -9 %
88	Turquie	IT	2	76K €	93K €	◆ 22 %	505	609	◆ 21 %	111	99	▲ -11 %
94	Israel	IT	2	91K €	111K €	◆ 22 %	508	529	▲ 4 %	105	98	▲ -7 %
61	Republique Chèque	IT	1	93K €	111K €	◆ 19 %	478	495	▲ 4 %	99	93	▲ -6 %
97	Japon	IT	1	70K €	83K €	◆ 18 %	580	587	▲ 1 %	81	72	▲ -11 %
76	Bielorussie	IT	1	76K €	89K €	◆ 17 %	555	454	● -18 %	109	103	▲ -6 %
64	Serbie	IT	1	90K €	105K €	◆ 16 %	812	596	● -27 %	131	120	▲ -8 %
62	Slovaquie	IT	2	100K €	116K €	◆ 16 %	431	364	● -16 %	63	58	▲ -8 %
25	Togo	Marketing	1	500K €	578K €	◆ 16 %	415	365	● -12 %	35	30	▲ -14 %
93	Danemark	IT	2	74K €	85K €	▲ 14 %	565	536	● -5 %	97	92	▲ -5 %
Total				18 767K €	21 250K €	13 %	23363	20206	-14 %	3906	3333	-15 %
